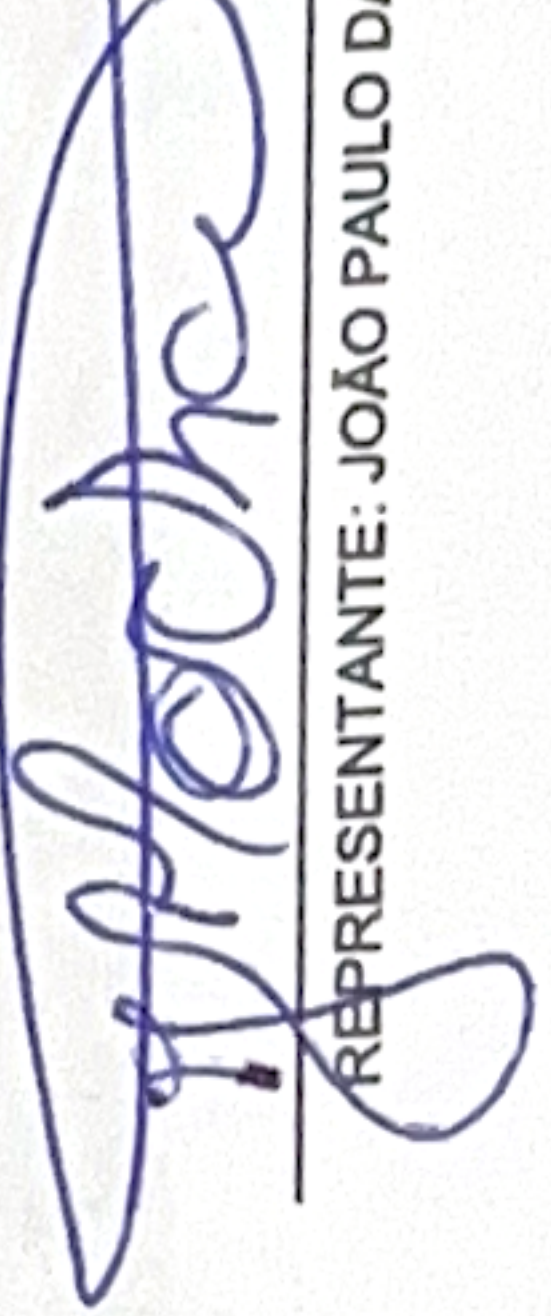


CIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ N.º 51.837.468/0001-76 Rua Alderige Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MG E-mail: cirengenhariaeconstrucao@gmail.com										MEDICÃO N. 09									
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG										VALOR MÃO DE OBRA (MEDICÃO 09): R\$ 51.261,60									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES										DATA: 01/10/2025									
										PRAZO DA OBRA: 12 MESES									
END.: BAIRRO CACHOEIRINHA																			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12				
1	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,03%	100,00%															
		Financeiro	144,69	144,69															
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,55%	35,00%	10,00%	5,00%		50,00%											
		Financeiro	7.475,65	2.616,48	747,57	373,78		3.737,83											
3	FUNDAÇÕES	Físico %	17,24%	15,00%	10,00%	25,00%			10,00%										
		Financeiro	83.148,52	12.471,03	8.310,98	20.784,67			33.260,39										
4	ESTRUTURA	Físico %	7,68%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%									
		Financeiro	37.040,64		7.408,13	7.408,13	3.704,06	7.408,13	3.704,06	7.408,13									
5	ALVENARIAS	Físico %	12,94%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%									
		Financeiro	62.409,62		12.481,92	12.481,92	6.240,96	12.481,92	6.240,96	12.481,92									
6	COBERTURA E FORRO	Físico %	15,34%				10,00%	40,00%	20,00%	10,00%	20,00%								
		Financeiro	73.984,82				7.398,48	29.593,93	14.794,56	7.398,48	14.799,36								
7	REVESTIMENTOS	Físico %	10,77%				5,00%	20,00%	10,00%	55,00%	20,00%	10,00%							
		Financeiro	51.943,71				2.597,19		5.194,37	28.569,04	10.388,74	5.194,37							
8	PISOS	Físico %	6,04%				15,00%	15,00%			40,00%	20,00%							
		Financeiro	29.130,92				4.370,41	4.370,41			11.652,33	5.826,18							
9	ESQUADRIAS	Físico %	7,33%							15,00%	75,00%	10,00%							
		Financeiro	35.352,59							5.299,13	26.514,44	3.539,02							
10	PINTURA	Físico %	4,83%									75,00%							
		Financeiro	23.295,09									17.471,32							
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	9,72%								50,00%	25,00%							
		Financeiro	46.879,56								23.439,78	11.719,89							
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	6,23%								50,00%	25,00%							
		Financeiro	30.047,29								15.023,65	7.510,82							
13	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,30%																
		Financeiro	1.446,90																
TOTAL		Físico %	100,00%	3,16%	6,00%	8,51%	5,04%	18,84%	7,93%	12,68%	21,11%	10,63%							
		Financeiro	R\$ 482.300,00	15.232,20	28.948,60	41.048,50	24.311,10	90.852,60	38.255,40	61.156,70	101.818,30	51.261,60							

RESUMO: PREGÃO: 025/2024
UNIDADE: M2
QUANTIDADE: 910,00
PROPOSTA UNITÁRIA: R\$ 530,00
VALOR TOTAL: R\$ 482.300,00

MEDICÃO 09: R\$ 51.261,60 /530 = 96,72 M2


REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D
Engenheiro Fiscal
